Project Sterrenberg

Gemeente Roermond
Doorlooptijd project

BAM Infra regionaal Helmond
Steenovenweg 46 / 5708 HN Helmond /
richard.h.janssen@bam.com

Id	WBS	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
0	0	**Project Sterrenberg**	**118 d**	**din 26-9-17**	**don 5-4-18**
1	1	Voorlopige gunning	0 d	din 26-9-17	din 26-9-17
2	2	Gunning	0 d	din 17-10-17	din 17-10-17
3	3	**Communicatie**	**109 d**	**maa 9-10-17**	**don 5-4-18**
31	4	**Voorbereiding**	**30 d**	**woe 27-9-17**	**din 7-11-17**
34	5	Start uitvoering	0 d	din 24-10-17	din 24-10-17
35	6	BBS KF ingekocht zijn over 4 weken op afroep beschikbaar	0 d	don 5-10-17	don 5-10-17
36	7	**1. Tijdelijke doorsteek Apollostraat Plutolaan, parkeervakken en fietspad Koninginnenlaan**	**9 d**	**din 24-10-17**	**vri 3-11-17**
41	8	**Jupiterstraat, (gedeelte) Plutolaan, Apollostraat en Saturnusstraat**	**45 d**	**maa 30-10-17**	**vri 19-1-18**
42	8.1	**2. Jupiterstraat huisnummers 11 t/m 37, Plutolaan 10 t/m 18 en 23 t/m 27**	**10 d**	**maa 30-10-17**	**vri 10-11-17**
48	8.2	**3. Jupiterstraat huisnummers 1 t/m 9, Plutolaan 20,22 en 29 t/m 43 en Apollostraat 29 t/m 43**	**10 d**	**maa 6-11-17**	**vri 17-11-17**
54	8.3	**4. Plutolaan 67 en Apollostraat 23 t/m 29**	**10 d**	**maa 13-11-17**	**vri 24-11-17**
60	8.4	**5. Plutolaan 69 t/m 87 en 24 t/m 28 en Apollostraat 1 t/m 21 en 12 t/m 22**	**10 d**	**maa 20-11-17**	**vri 1-12-17**
66	8.5	**6.Apollostraat 2 t/m 10 en Saturnusstraat 30 t/m 66**	**10 d**	**maa 27-11-17**	**vri 8-12-17**
72	8.6	**7.Jupiterstraat 24 t/m 28 en 39 t/m 47 en Saturnusstraat 20 t/m 28**	**10 d**	**maa 4-12-17**	**vri 15-12-17**
78	8.7	**8.Jupiterstraat 30 t/m 44 en 65 t/m 79 en Saturnusstraat 2 t/m 18**	**10 d**	**maa 11-12-17**	**vri 22-12-17**
84	9	**FASE 2 Mercuriusstraat , Plutolaan huisnummer 2 t/m 121**	**40 d**	**maa 15-1-18**	**vri 16-3-18**
85	9.1	**9. Plutolaan 30 t/m 50 en 89 t/m 113**	**10 d**	**maa 15-1-18**	**vri 26-1-18**
91	9.2	**10. Plutolaan 52, 54 en 115 t/m 131**	**10 d**	**maa 22-1-18**	**vri 2-2-18**
97	9.3	**11. Plutolaan 56 t/m 66 en 155 t/m 175**	**10 d**	**maa 29-1-18**	**vri 9-2-18**
103	9.4	**12. Mercuriusstraat 30 t/m 50 en 89 t/m 113**	**10 d**	**maa 19-2-18**	**vri 2-3-18**
109	9.5	**13. Mercuriusstraat 6 t/m 16 en 109**	**10 d**	**maa 26-2-18**	**vri 9-3-18**
115	9.6	**14. Mercuriusstraat 2 t/m 4a**	**10 d**	**maa 5-3-18**	**vri 16-3-18**
121	10	**15. Afwerking**	**15 d**	**maa 12-3-18**	**vri 30-3-18**
126	11	Oplevering	0 d	vri 30-3-18	vri 30-3-18

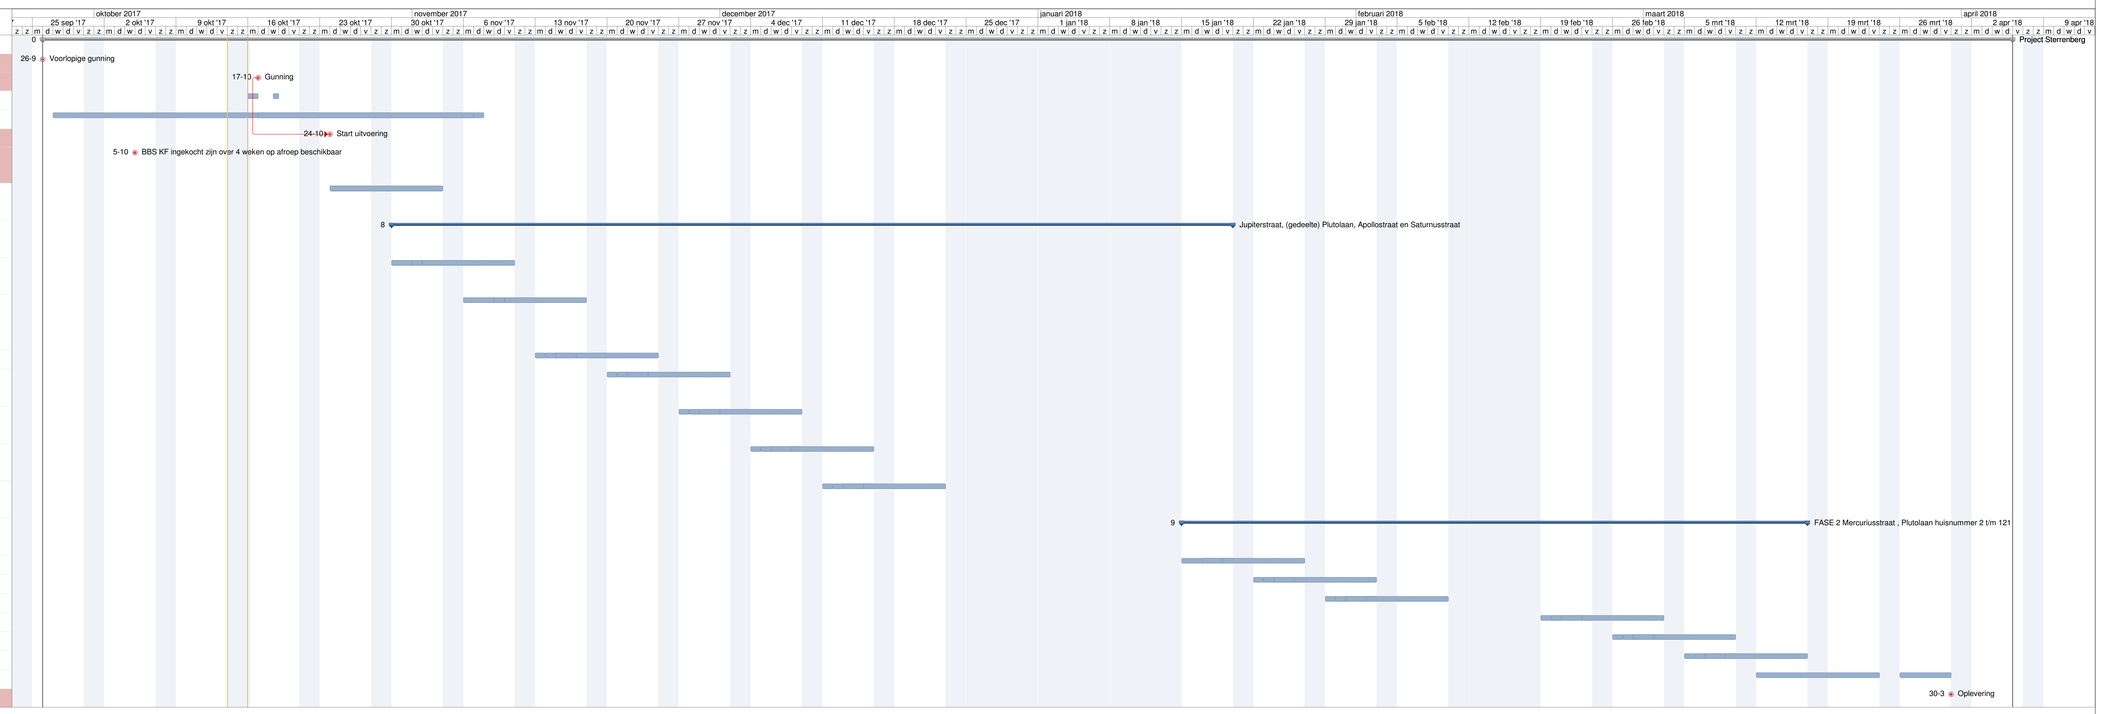

Statusdatum	vri 13-10-17
Versie nr.	V2.0
Documentnummer	Bijlage A
Blad	1 van 1

Algemeen/Voorbereiding · Opbreken/Opruimen · Maatvoering · Grondwerk · Rioleren · Funderingen · Straatwerk · Asfalt · Verkeersmaatregelen · Markeringen · Geleiderail · Geluidsschermen · Groenvoorzieningen · Beton werkzaamheden · Kritieke taak · Mijlpaal
